


総管	安管	記入者	安全パトロール点検表 (会社名) 平山工業				
		日原					
工 事 名	令和6年度国道31号・185号呉保守工事			実 施 者	日原 勉		
責 任 者 名	元請：大成ロテック 1次：東興ジオテック			実施月日	2026年1月15日		
本日の作業人員		5名	工 期	自 2026年 1月 5日 至 2026年 3月 31日		進捗率	%
項 目			良否	処 置		項 目	良否 処 置
事務所・休憩所一般事項	看板、安全旗、社旗、消火器、救急箱はあるか			足場（立脚・うま等）関係	2 m以上に作業床があるか		
	安全衛生管理組織図、緊急時連絡表等あるか	○			作業床の巾は40cm以上あるか		
	工事安全工程表あるか				すき間は3cm以下か		
	安全施工サイクル実施図は	○			手摺は75cm以上か(90cm以上には中さんをつける)		
	作業者の安全心得はあるか				建地間隔は2.5m以下か		
	火元責任者の標札はあるか				根がらみはよい		
	救急箱標札はあるか				筋かい 材料は適切か		
	消火器標札はあるか				積載表示はしてあるか		
	安全衛生管理者、作業主任者名簿(様式2号)があるか	○			危険箇所及注意標識はしてあるか		
	作業員名簿はあるか	○			登り桟橋は適切か(踏さん30cm～40cm)巾30cm以上手摺		
	持込機械使用許可願はあるか	○			踊場は7m毎に設けてあるか		
	使用機械の検査証の写しはあるか	○			点検はしているか		
	安全工程打合せ安全ミーティングの記録はあるか	○			損傷変形はないか		
	免許資格者の写しはあるか	○			開き止め据付状況はよい		
	始業点検記録はあるか	○			足場板のかけ渡しはよい		
	整理整頓はよい	○			(はね出し たるみ等)		
	火気取扱状況ははよい				使用の高さはよい(単独2m以下)		
	危険物の保管はよい				作業主任者の直接指揮で作業をしているか		
	作業主任者の職務の表示は						
	作業場（通路）関係	踏ぬき、つまづきの心配はない	○			墜落関係	危険箇所表示はしてあるか
落下物の心配はない		○		開口部の手すり、囲い、柵、覆いは良い			
昇降するのに危険はない		○		材料のかけ渡し、固定状況、手すりはよい			
整理整頓は良い		○		スレート等屋根の歩み板の状況はよい			
危険箇所の表示はよい		○		安全帯の使用状況はよい			
保安帽の着用はよい		○		防網のたるみ、取付はよい			
服装履物はよい		○		はしごの固定はよい			
作業行動はよい		○					
第三者の通路確保はよい		○					

項 目		良否	処 置	項 目		良否	処 置
地山掘削・法面清掃関係	切取面の勾配はよい			発破関係	火薬庫の施錠はよい		
	切取面の落石対策はしてある				火薬取扱所の整備状況はよい		
	作業に関係ないものの立入				火薬類の運搬状況はよい		
	禁止はしてある				取扱者の表示はある		
	作業主任者が直接指揮している				待避場所及行動はよい		
	重機の転倒、転落の心配はない				不発残火薬の処置状況はよい		
	危険箇所での誘導者はいる				待避の合図は定められている		
	命綱は使用している				取扱所周囲の囲いはよい		
	始業点検はしている						
	湧水等の対策している						
	作業箇所への通路はよい						
	危険な作業をしていない						
	埋設物等調査をした						
土止め（型枠）支保工関係	部材の変形損傷脱落はない			機械・電気・仮設関係	機械設備場所の整備はよい	○	
	部材の取付部、接合部、交差部の異常はない				届出、認(許)可検査の状況はよい	○	
	矢板のふくらみはない				持込許可証、運転責任者の表示はよい	○	
	地山と密着している				機械器具の安全装置はよい	○	
	切りばり腹おこしを足場がわりにしたり重量物をのせていない				起動装置の施錠はよい	○	
	掘削土、資材を法肩附近においていない				電動機などのアースはよい	○	
	支保工は垂直である				配線状況はよい	○	
	深さ1.5m以上は昇降機施設がある				分電盤等の責任者の表示はよい		
	作業主任者の直接指揮している				感電及接触防止の表示はよい		
	始業点検はしている				通路面の配線状況はよい	○	
					ワイヤーの巻過ぎ防止はよい		
					ワイヤーの通っている箇所の状態はよい		
	交通（道路）関係	バリケード等で道路が確保されている	○			評価及び意見	ワイヤーの取付部分の締結状態はよい
案内規制危険標識はよい		○		ワイヤーのキンク腐蝕の状態はよい			
必要に応じ誘導員が配備されている		○		ブレーキクラッチの状態はよい	○		
危険な箇所は表示されている		○		始業点検はしている	○		
				作業内容：差し筋アンカー・型枠 工事車両歯止め確認済			

(注)良否の欄は良は○、否は×、関係の内項目は レ で表す



安全掲示板設置状況

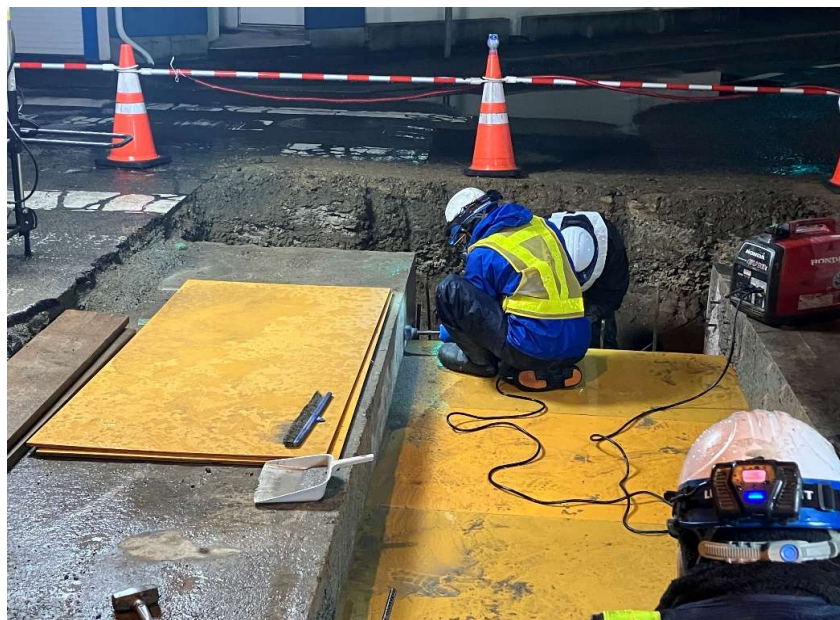

施工状況(側面部目荒らし)



施工状況(側面部目荒らし)

工事車両歯止め状況

